Commune : Domloup
Projet : RD463 - AEP Piste Cyclable
MAJ 25/03/26
Type de travaux : Renouvellemnt conduites AEP

Equipe travaux N°1 | Travaux TRANCHEUSE | sstraitant | contrôles | Finitions / Réfections | Travaux par Aspiration

25/03/2026

eau des PORTES de BRETAGNE — ARTELIA — SATEC DÉPLOYER NOTRE RÉSEAU
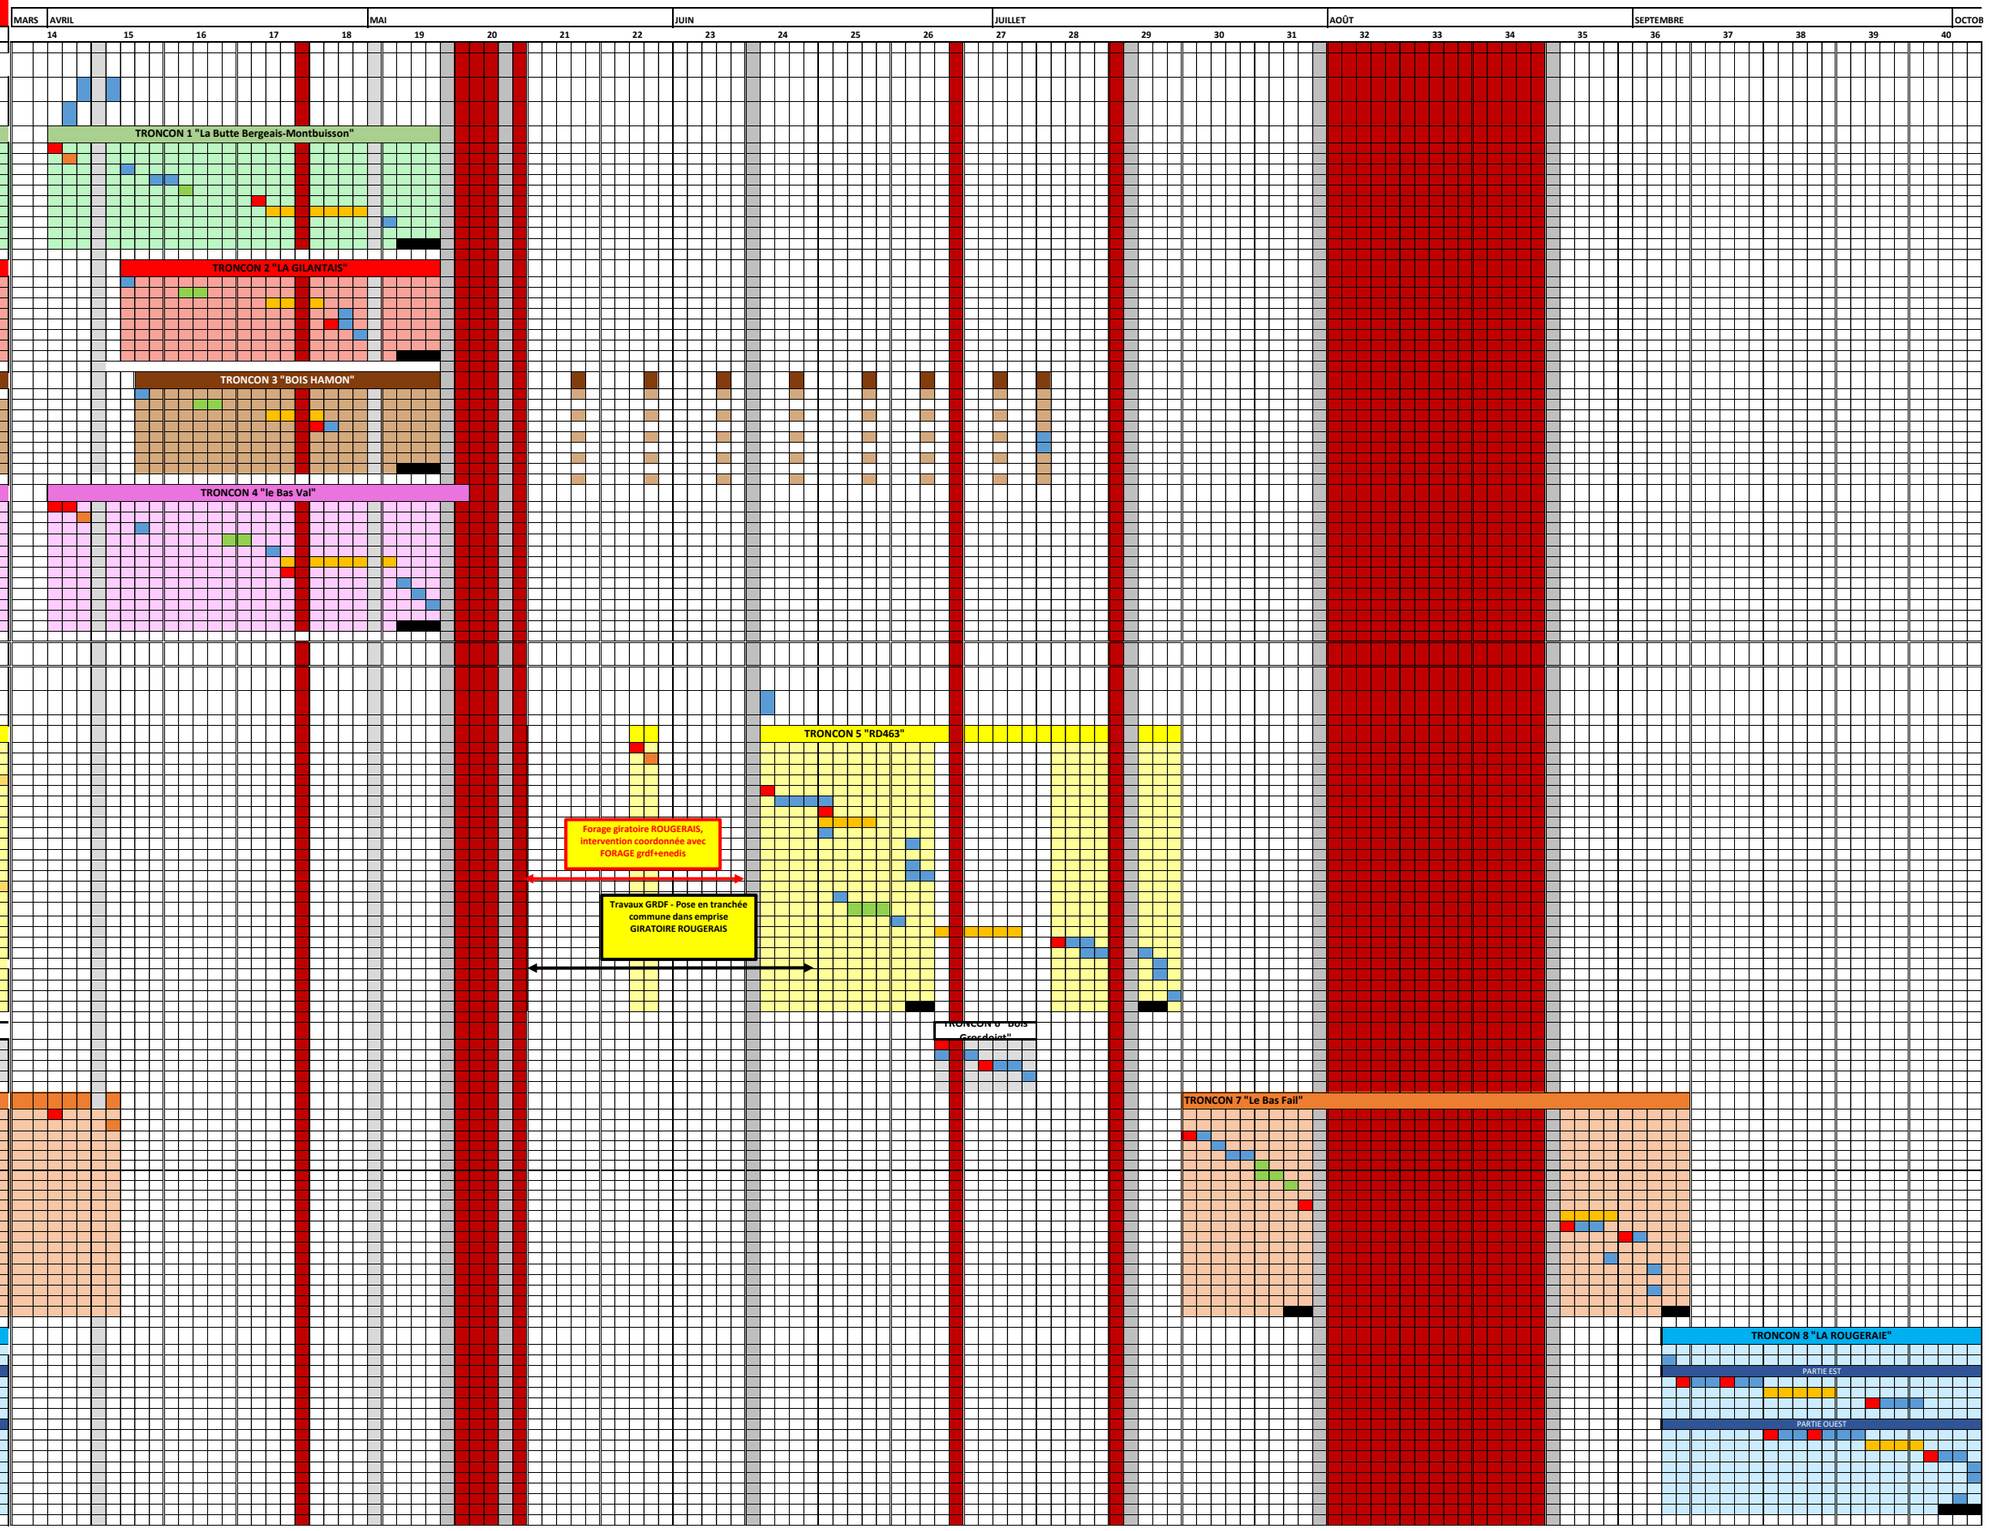
DESIGNATION	unité	quantité	Rnt	nb j.
INSTALLATION				
PHASE 1 - AVRIL 2026				
INSTALLATION PHASE 1				
LIVRAISONS				
TRONCON 1 "La Butte Bergeais-Montbuisson"				
FOUILLES FORAGE	u	2	4,00	0,5
FORAGE (Armor Forage)	u	2	2,00	1
PREPARATION - SONDAGES-DEROULAGE-SOUDURE	ml	400	400,00	1
TRONCON SUD (pose traditionnel)	ML	145	70,00	2
TRONCON NORD (pose mécanisé)	ML	250	250,00	1
RACCORDEMENT FORAGE+PREPA BRANCHEMENT MONTBUISSON	u	2	2,00	1
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION - DESINFECTION				
PREPA +ALIM PROVISOIRE PURGE + BASCUL BRANCHEMENT	u	1	1,00	1
REFECTIONS / MACONNERIES				
TRONCON 2 "LA GILANTAIS"				
PREPARATION - SONDAGES-DEROULAGE-SOUDURE	ml	550	550,00	1,0
TRONCON VOIE COMMUNALE + CHEMIN (pose mécanisé)	ML	550	355,00	1,5
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION - DESINFECTION				
PREP RACCORDEMENT + TRAVERSSEE DE ROUTE	unité	1	2,00	0,5
PREPA BRANCHEMENT	unité	1	1,00	1,0
RACCORDEMENTS R1 + BASCUL BRANCHEMENT	unité	1	1,00	1,0
REFECTIONS / MACONNERIES				
TRONCON 3 "BOIS HAMON"				
PREPARATION - SONDAGES-DEROULAGE-SOUDURE	unité	500	500,00	1,0
TRONCON VOIE COMMUNALE + CHEMIN (pose mécanisé)	ML	500	330,00	1,5
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION				
PREPA BRANCHEMENT	unité	1	1,00	1,0
BASCUL BRANCHEMENT	u	1	2,00	0,5
DEPOSE CONDUITE PAR EXTRACTION	u	1	2,00	0,5
REFECTIONS / MACONNERIES				
TRONCON 4 "le Bas Val"				
FOUILLES FORAGE	u	2	4,00	0,5
FORAGE (Armor Forage)				
PREPARATION - SONDAGES-DEROULAGE-SOUDURE	ml	320	320,00	1
TRONCON VOIE COMMUNALE + CHEMIN (pose mécanisé)	ML	320	210,00	1,5
RACCORDEMENT FORAGE+PREPA BRANCHEMENT MONTBUISSON	u	2	2,00	1
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION - DESINFECTION				
PREPA BRANCHEMENT	unité	3	3,00	1
BASCULEMENT DES BRANCHEMENTS	unité	3	3,00	1
RACCORDEMENTS R2	unité	1	2,00	0,5
NETTOYAGE-FINITIONS				
REFECTIONS / MACONNERIES				
PHASE 2 - JUIN 2026				
INSTALLATION PHASE 2				
TRONCON 5 "RD463"				
FOUILLES FORAGE	u	2	4,00	0,5
FORAGE (Armor Forage)				
PARTIE GIRATOIRE ROUGERAIE				
PREPARATION - SONDAGES-DEROULAGE-SOUDURE	ml	400	780,00	0,5
TRONCON VOIE PISTE CYCLABLE (TRADI)	ML	400	110,00	3,6
RACCORDEMENT FORAGE+PREPA BRANCHEMENT KERSEUL	u	2	4,00	0,5
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION - DESINFECTION				
PREPA BRANCHEMENT	unité	1	2,50	0,4
BASCULEMENT DES BRANCHEMENTS	unité	1	4,00	0,25
PREPA RACCORDEMENT R5 SALIM SUR PURGE PAR CPC SUR EXISTANTE	unité	1	4,00	0,25
RACCORDEMENTS R5	unité	1	4,00	0,25
PARTIE PISTE CYCLABLE + CHEMIN AGRICOLE				
PREPARATION - SONDAGES-DEROULAGE-SOUDURE	ml	1160	580,00	2
TRONCON VOIE PISTE CYCLABLE (pose mécanisé)	ML	1160	400,00	3
RACCORDEMENT FORAGE+PREPA BRANCHEMENT MONTBUISSON	u	2	2,00	1
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION - DESINFECTION				
PREPA BRANCHEMENT	unité	7	3,00	2,33
BASCULEMENT DES BRANCHEMENTS	unité	7	3,00	2,33
PREPA RACCORDEMENT R4	unité	1	2,00	0,5
RACCORDEMENTS R4	unité	1	2,00	0,5
FINITIONS				
REFECTIONS / MACONNERIES				
TRONCON 6 "Bois Grosdoigt"				
PREPARATION - SONDAGES-DEROULAGE-SOUDURE	ml	170	340,00	0,5
TRONCON Partelle Agricole "bois grosdoigt" (pose tradi - pelle chenille)	ML	200	133,00	1,5
TRANCHEE BRANCHEMENT PRIVEE	unité	1	0,66	1,5
BASCULEMENT DES BRANCHEMENTS	unité	3	3,00	1
TRONCON 7 "Le Bas Fail"				
FOUILLES FORAGE	u	2	4,00	0,5
FORAGE (Armor Forage)				
PREPARATION - SONDAGES-DEROULAGE-SOUDURE	ml	1400	700,00	2
TRONCON VC "La Reposé" (pose tradi)	ML	70	70,00	1,0
TRONCON VC "Le Haut Poirier" (pose tradi)	ML	115	57,50	2
TRONCON VC "Les Horizons" (pose mécanisé)	ML	230	397,00	0,6
TRONCON PISTE "FUTURE ROUTE" (pose mécanisé)	ML	530	399,00	1,3
TRONCON VC "Le Bas Fail" (pose mécanisé)	ML	470	397,00	1,2
RACCORDEMENT FORAGE+PREPA BRANCHEMENT MONTBUISSON	u	2	2,00	1
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION - DESINFECTION				
PREPA BRANCHEMENT	unité	7	2,50	3
BASCULEMENT DES BRANCHEMENTS	unité	7	3,00	2
PREPA RACCORDEMENT R5	unité	2	2,00	1
RACCORDEMENTS R5	unité	1	2,00	0,5
FINITIONS				
REFECTIONS / MACONNERIES				
TRONCON 8 "LA ROUGERAIE"				
PREPARATION - SONDAGES-BARDAGE	ml	900	900,00	1
PARTIE EST				
TRONCON VOIE COMMUNALE PARTIE EST DU PONT (pose TRADI)	ml	400	65,00	6
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION - DESINFECTION - PARTIE EST DU PONT				
PREPA + BASCULEMENT BRANCHEMENT	unité	8	2,00	4
PARTIE OUEST				
TRONCON VOIE COMMUNALE PARTIE OUEST DU PONT (pose TRADI)	ml	500	70,00	7
PASSAGE BOUCHON RACLEUR + ESSAI PRESSION - DESINFECTION - PARTIE EST DU PONT				
PREPA + BASCULEMENT BRANCHEMENT	unité	5	1,50	3
PREPA RACCORDEMENT R6+R7	unité	1	1,00	1
RACCORDEMENTS R6+R7	unité	1	1,00	1
FINITIONS				
REFECTIONS / MACONNERIES				
				#DIV/0!
